RECONSTRUCTION DES PONTS

PONT FRANCVAL
ET ETAT D'AVANCEMENT DES AUTRES CHANTIERS

8 MARS 2023

VERVIERS

▶ REFECTIONS DES PONTS ET PASSERELLES IMPACTES

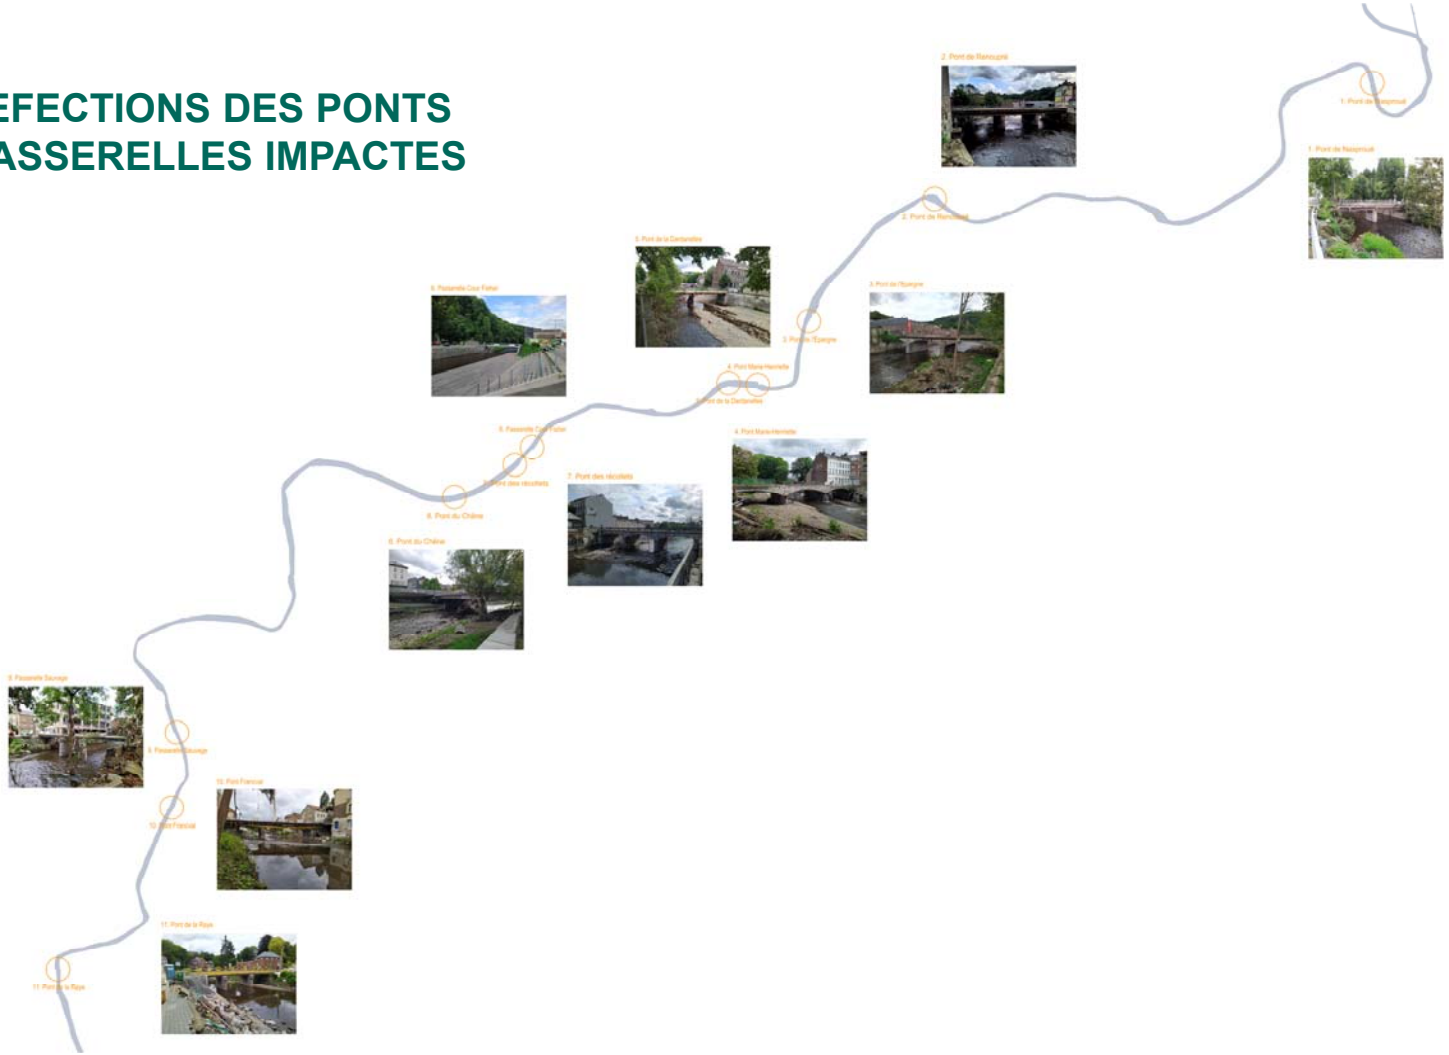

MARCHE PONT FRANCVAL - ENSIVAL

- ✓ Pose du caisson métallique du pont : le 08/03/23
- ✓ Fin du chantier estimée : juillet 23
- ✓ Consiste en une intervention lourde et structurelle du pont, la travée centrale sera consolidée afin de ne pas reconstruire la pile centrale emportée lors des inondations (obstacle à l'écoulement de la Vesdre)
- ✓ Budget : 1.300.000 € TVAC

Elévation type AMONT suivant A-A

1/100

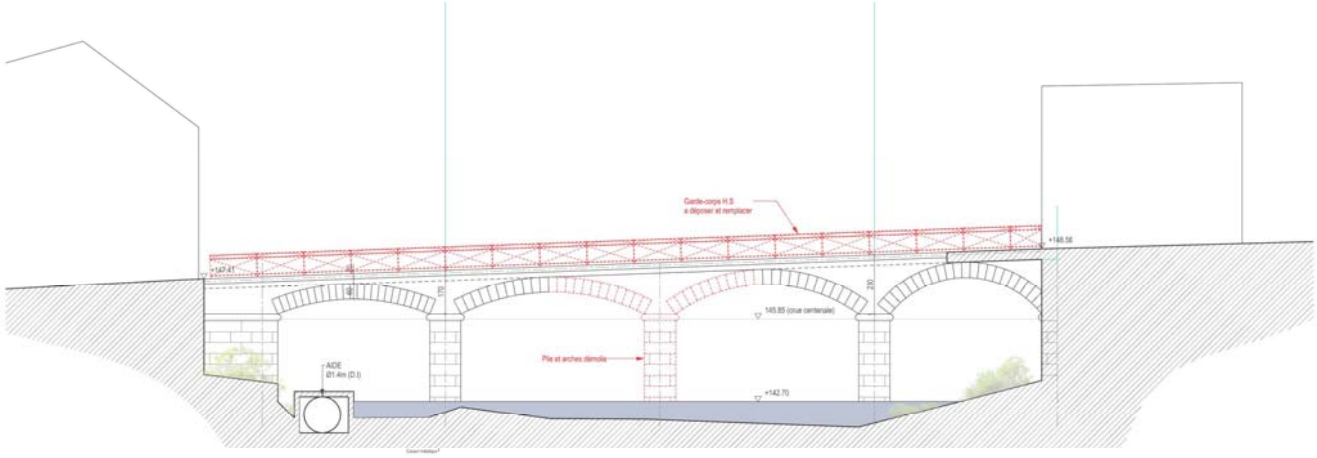

Elévation type AMONT suivant A-A

1/100

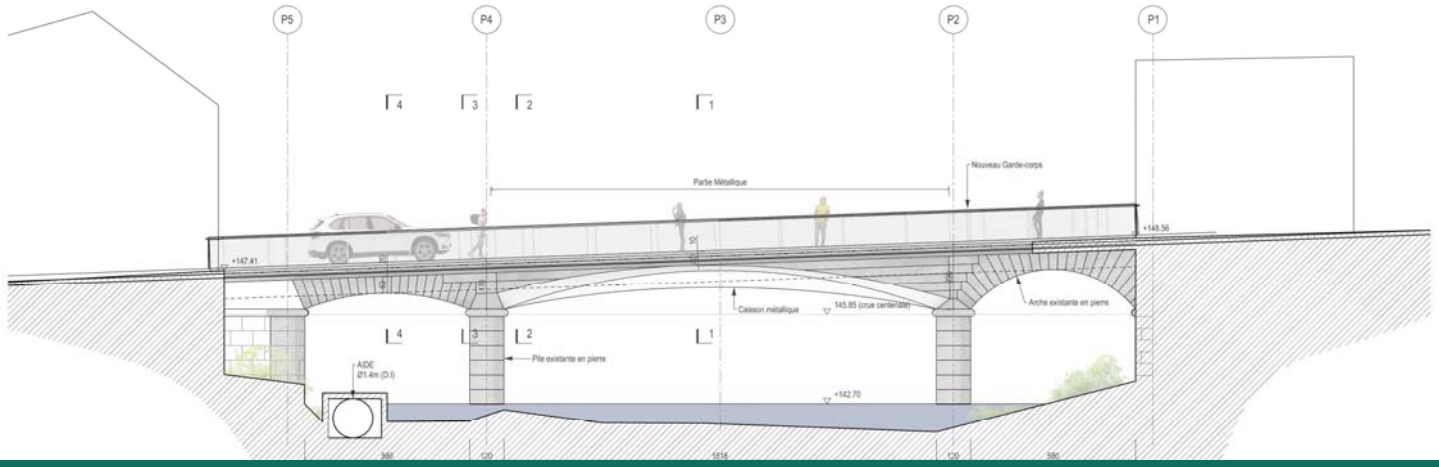

SEA
+partners

▶ MARCHE PASSERELLE ROGGEMAN / PONT DES RECOLLETS / PONT DU CHENE / PONT LEOPOLD / PASSERELLE SAUVAGE

- ✓ Planning : ce marché a été prolongé jusqu'à la mi-mai, il reste principalement des interventions en surface, notamment le remplacement des garde-corps
- ✓ Budget : 2.000.000 € TVAC

PONT DES DEMIS LUNES

- ✓ La sécurisation via barrières nadar est achevée, il n'y a pas d'autres interventions prévues dans le cadre de ce marché

▶ MARCHE PONT DE RENOUPRE / PONT MARIE HENRIETTE / PONT DE L'EPARGNE

- ✓ Consiste en des interventions d'importance moyenne (nouveaux complexes de revêtement et d'étanchéité, nouveaux trottoirs, garde-corps, éclairages,…)
- ✓ Budget : 1.900.000 € TVAC

✓ PONT DE RENOUPRE

- ✓ Il reste quelques interventions, la réouverture est prévue fin avril, sous réserve des conditions climatiques

✓ PONT MARIE-HENRIETTE

- ✓ Les travaux viennent de débuter et se termineront à l'automne 2023

Des sondages pour les impétrants ont débuté au pont Marie-Henriette pour la pose d'impétrants.
Le chantier débute en mars 2023. Dans le cadre du chantier et pour permettre aux ouvriers de travailler, la passerelle qui mène vers le parc Marie-Louise sera enlevée.
Dans le cadre du chantier de rénovation, le pont sera fermé aux piétons à certains moments afin de permettre à l'entreprise de travailler. La première période annoncée est 3 semaines à partir du 21 mars 2023.
En fonction des intempéries et de l'arrivage des éléments préfabriqués en béton, le chantier devrait se terminer à l'automne 2023.

✓ PONT DE L'EPARGNE

- ✓ Les travaux débuteront après la réouverture des ponts Marie-Henriette et Renoupré

MARCHE PONT DE NASPROUE / PONT DE LA RAYE

- ✓ Planning :
  - ✓ **Pont de la Raye** : début en avril, jusqu'en fin d'année 2023
  - ✓ **Pont de Nasproué** : début en mai, jusqu'en fin d'année 2023
- ✓ Consiste en un remplacement complet des ponts : destruction de l'existant et construction d'un nouvel ouvrage d'une seule travée (sans pile).
- ✓ Budget : 1.600.000 € TVAC

MARCHE PONT DES DARDANELLES

- ✓ Planning : les travaux devraient débuter après la réouverture du pont Marie-Henriette
- ✓ Consiste en une réfection lourde et structurelle du pont (le profil général du pont reste similaire)
- ✓ Budget : 830.000 € TVAC

PASSERELLE FIL DE FER

✓ Passerelle à créer, du côté du chemin des trois fontaines (Dison – Verviers).

Initialement, seules des conduites enjambaient la Vesdre. Nous profitons de la réfection du passage de ces conduites pour créer une passerelle piétonne, en collaboration avec Resa et la commune de Dison.

Cabinet de M. Loffet, Bourgmestre f.f.
087 325 201

Cabinet de M. Degey, Echevin des Travaux
087 326 006

Service des Travaux
087 327 502

Cellule Communication
087 326 064

VERVIERS
